


# Meersburg - Lehrenweg Baubeschluss – BA 1 (16.03.21)



# Gliederung

- Planung
- Kostenfortschreibung
- Zeitplan

# Übersichtslageplan 1. BA :

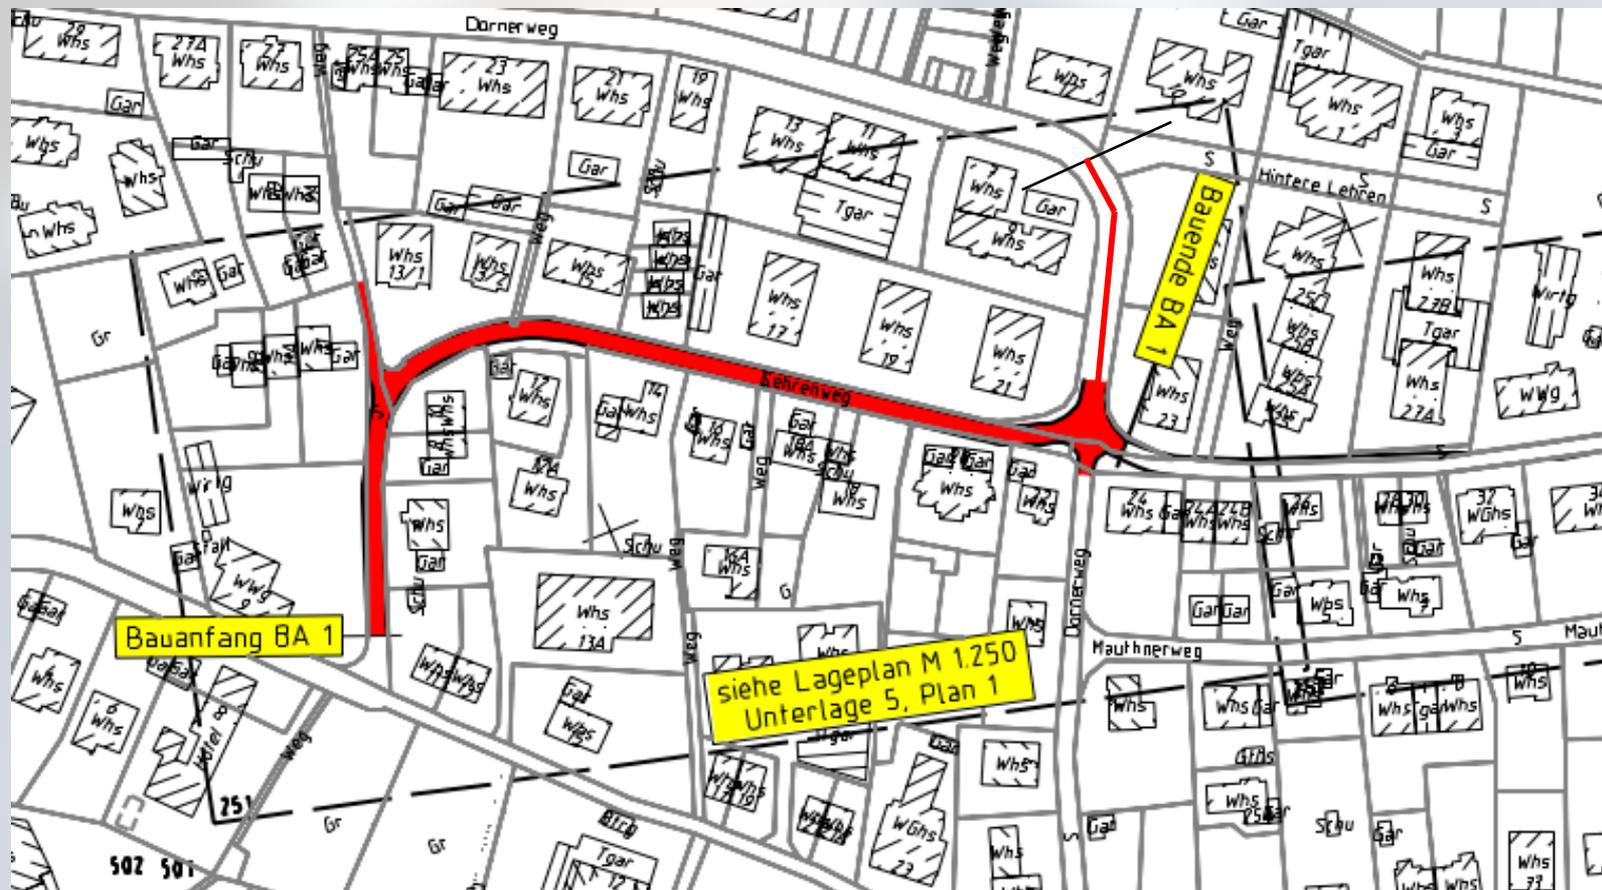

Baustrecke Lehrenweg  
Baustrecke Dornerweg:


L = 260 m  
L = 70 m




# Querschnitt Lehenweg

## Lehenweg

Dornerweg im Bereich Vollausbau (A120)  
und Anschluss Weg 669 (A110):  
gleicher Aufbau wie Lehenweg

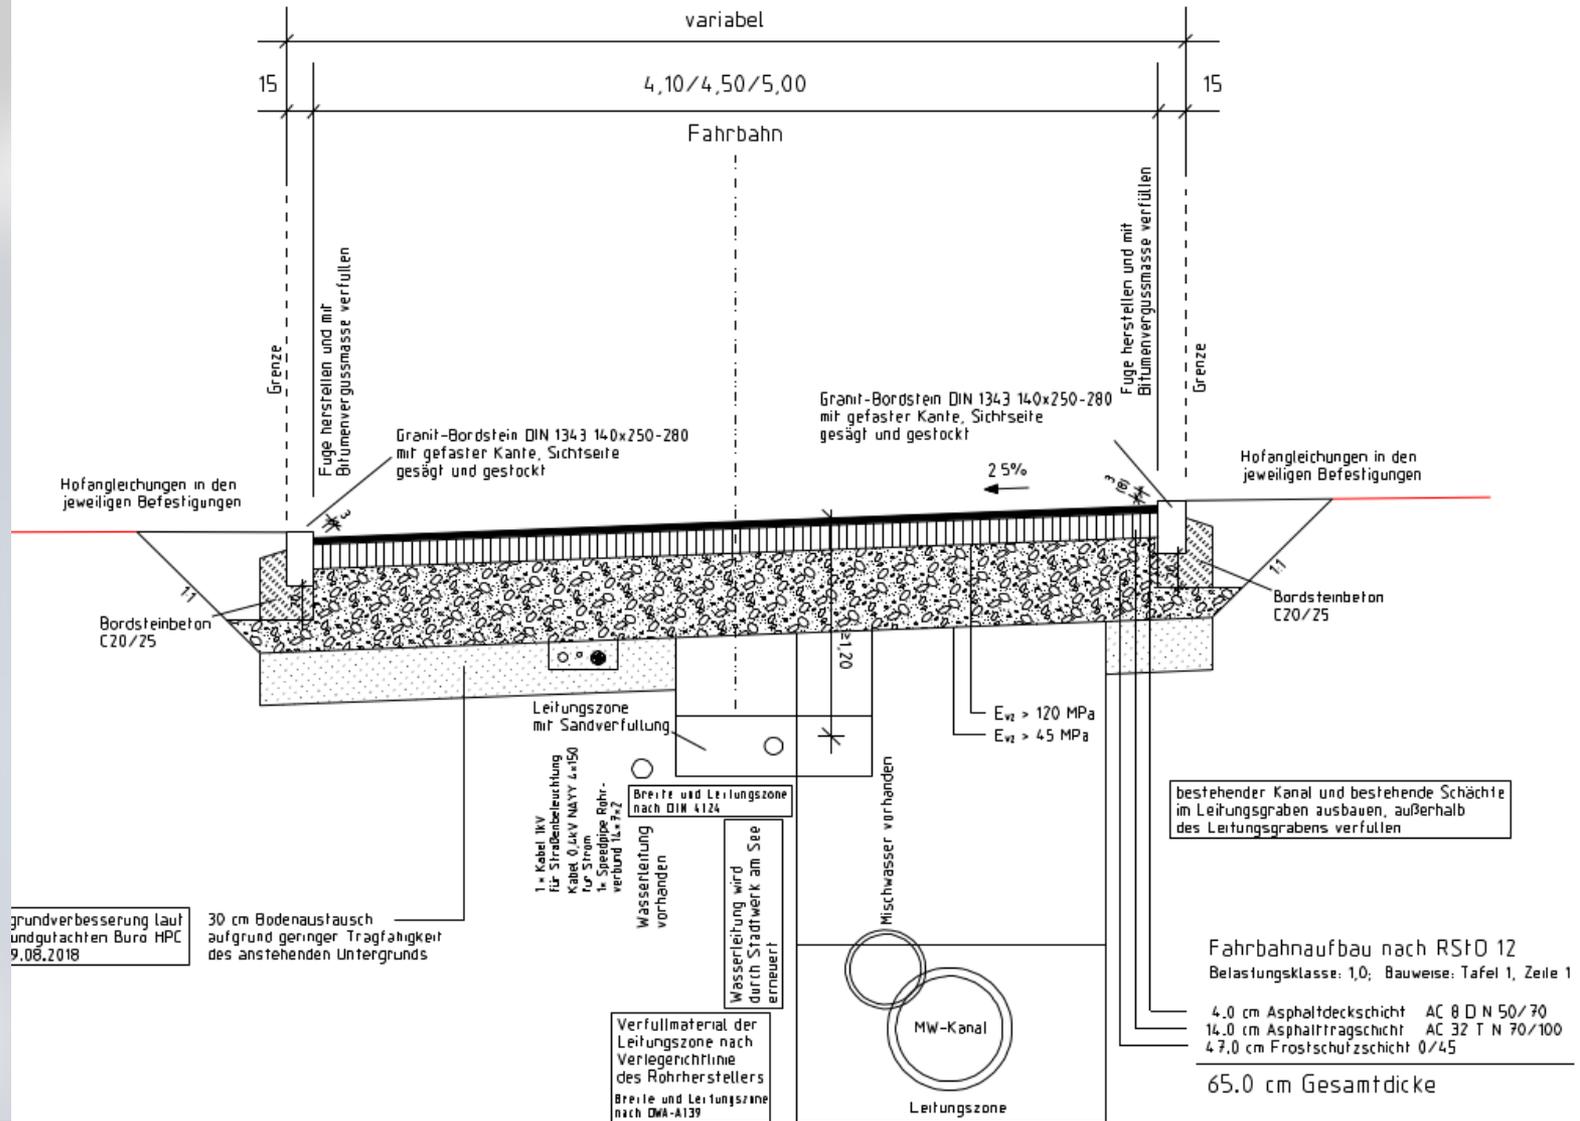


# Ruhender Verkehr

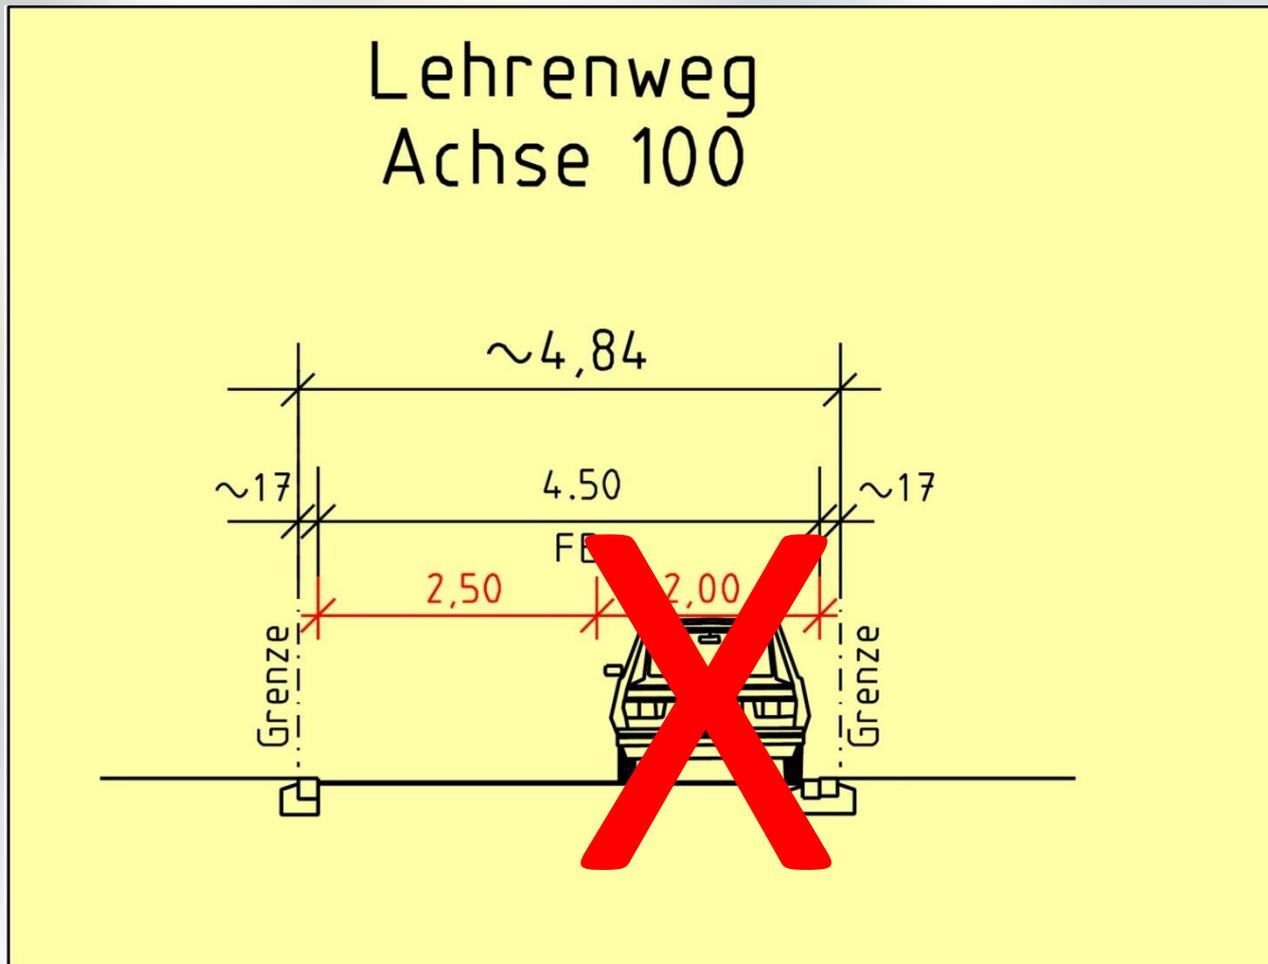

Verbleibende Fahrbahnbreite  
zu gering

# Querschnitt Dornerweg

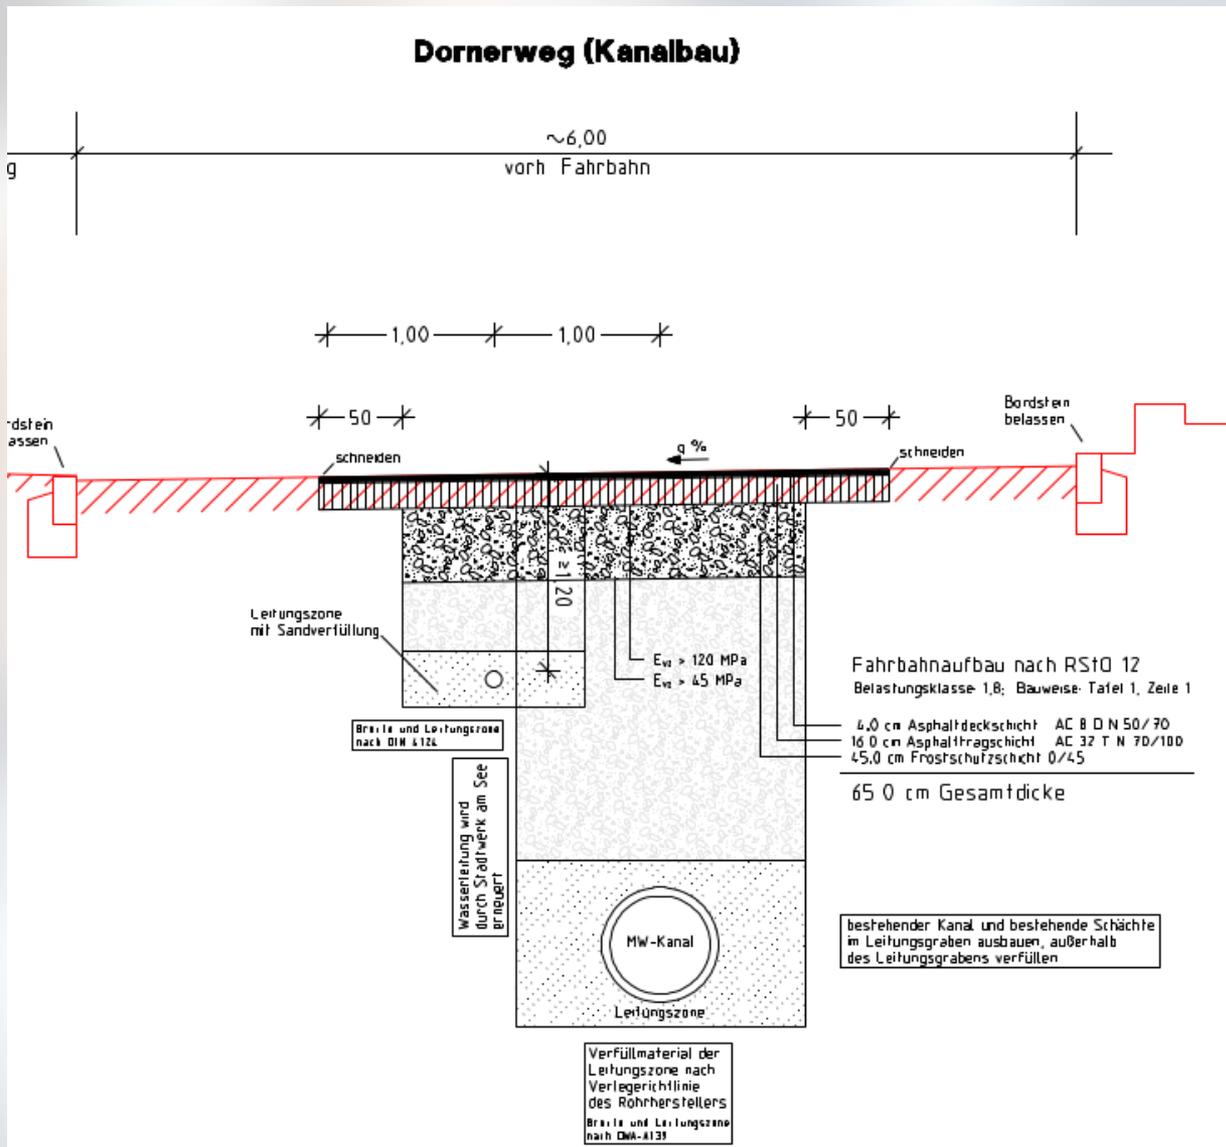

# Kostenfortschreibung

Maßnahme	Kostenberechnung (KB)	bepreistes LV	Kostenanschlag (KA)	Kostenfeststellung (KF)
Gewerk 1: Verkehrsanlage	1.064.000,00 €	1.000.000,00 €		
Gewerk 2: Kanalisation	1.077.000,00 €	900.000,00 €		
Gewerk 3: Straßenbeleuchtung	26.000,00 €	18.700,00 €		
Gewerk 4: DSL Verkabelung	52.000,00 €	43.000,00 €		
Gewerk 5: Tiefbau Wasserleitung (SWSee)	128.000,00 €	204.000,00 €		
Gewerk 6: Rohrmaterial Wasserleitung (SWSee)	65.000,00 €	106.000,00 €		
<b>Summe</b>	<b>2.412.000,00 €</b>	<b>2.271.700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Kosten incl. MwSt und Baunebenkosten</b>				
Beinhaltet BNK brutto 330.000,- €				

# Zeitplan

- 16.03.2021: GR-Sitzung mit Baubeschluss
- 19./20.03.2021: Veröffentlichung  
Staatsanzeiger/Südkurier/Homepage
- 15.04.2021: Submission
- 27.04.2021: Vergabevorschlag
- 11.05.2021: Vergabebesitzung
- 01.06.2021: Baubeginn
- 31.05.2022: Baufertigstellung

# **Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

**Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH**

**Beratende Ingenieure VBI**

**Sigmaringen - Überlingen – Stuttgart - Dresden**

**Verkehrsanlagen      Wasserwirtschaft**

**Umweltplanung**
