

Stadt Meersburg
Bodenseekreis

Vergabebesitzung



Erschließung Allmendweg - Erweiterung

Gemeinderatsitzung am 19.03.2019




Ingenieurbüro Dipl. Ing. K. Langenbach GmbH

Inhalt:

- Planung
- Ergebnis der Ausschreibung
- Kostenbericht
- Vergabevorschlag
- Zeitplan


Erschließung Allmendweg - Erweiterung
Luftbild



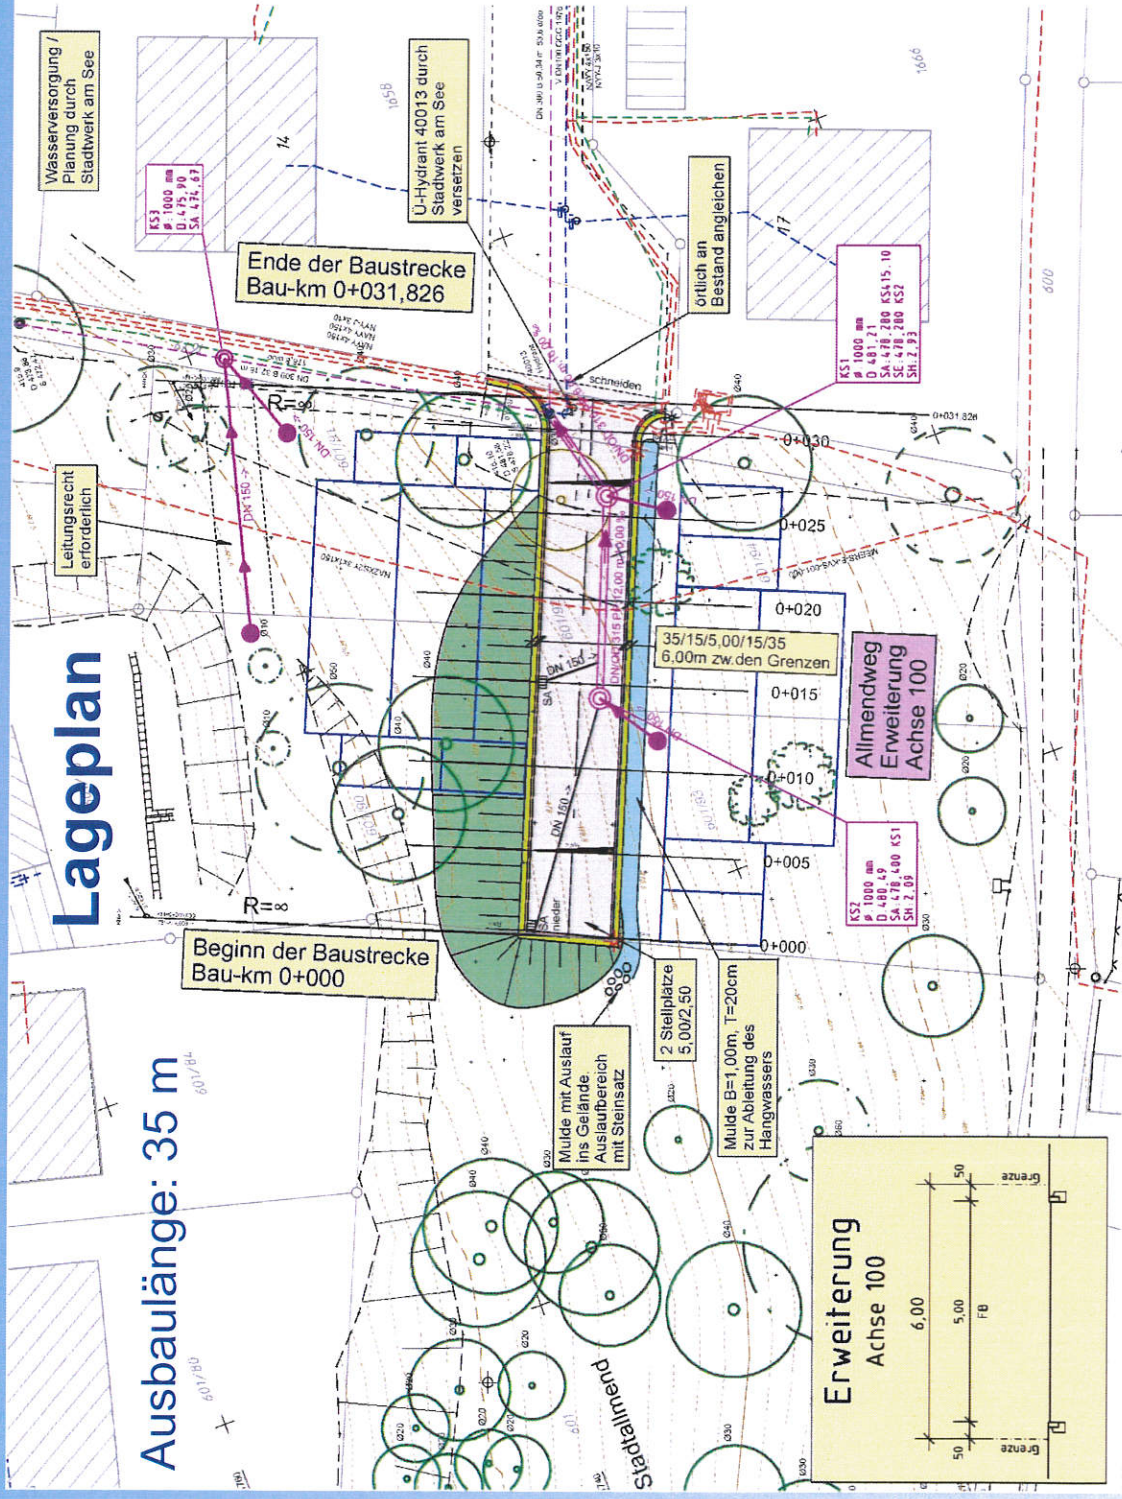


Ausbauquerschnitt

Allmendweg-Erweiterung

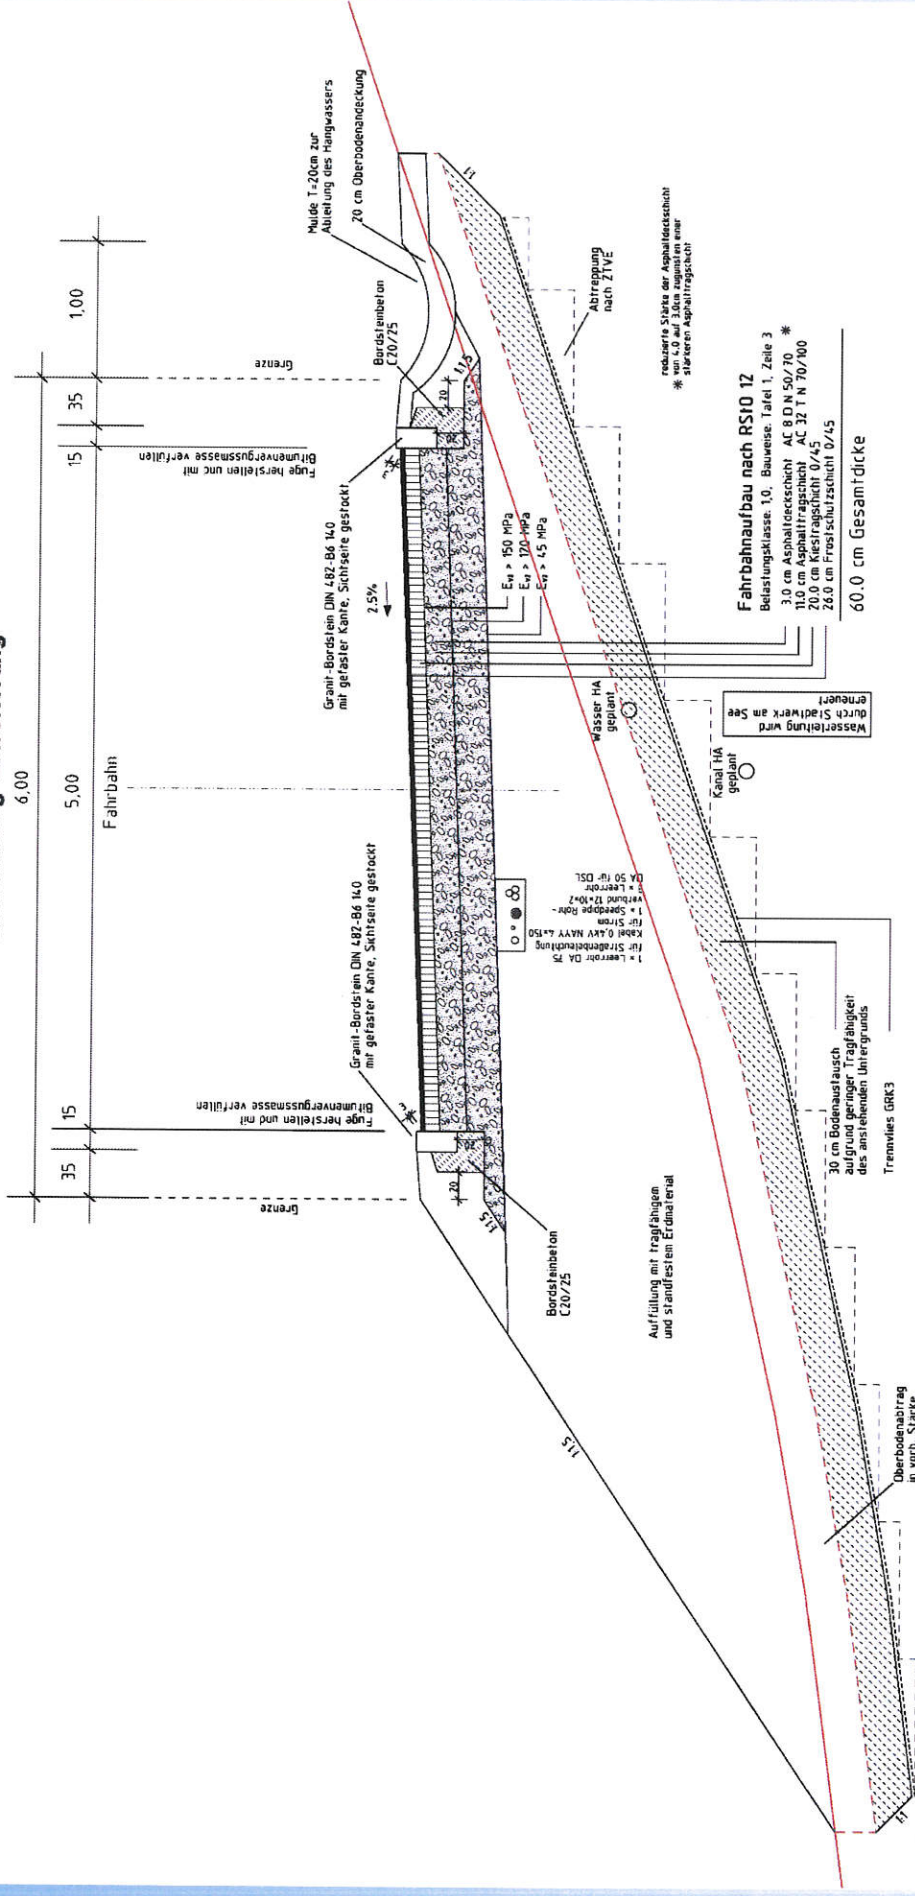

Höhenplan

Max. Längsgefälle: $s = 6 \%$

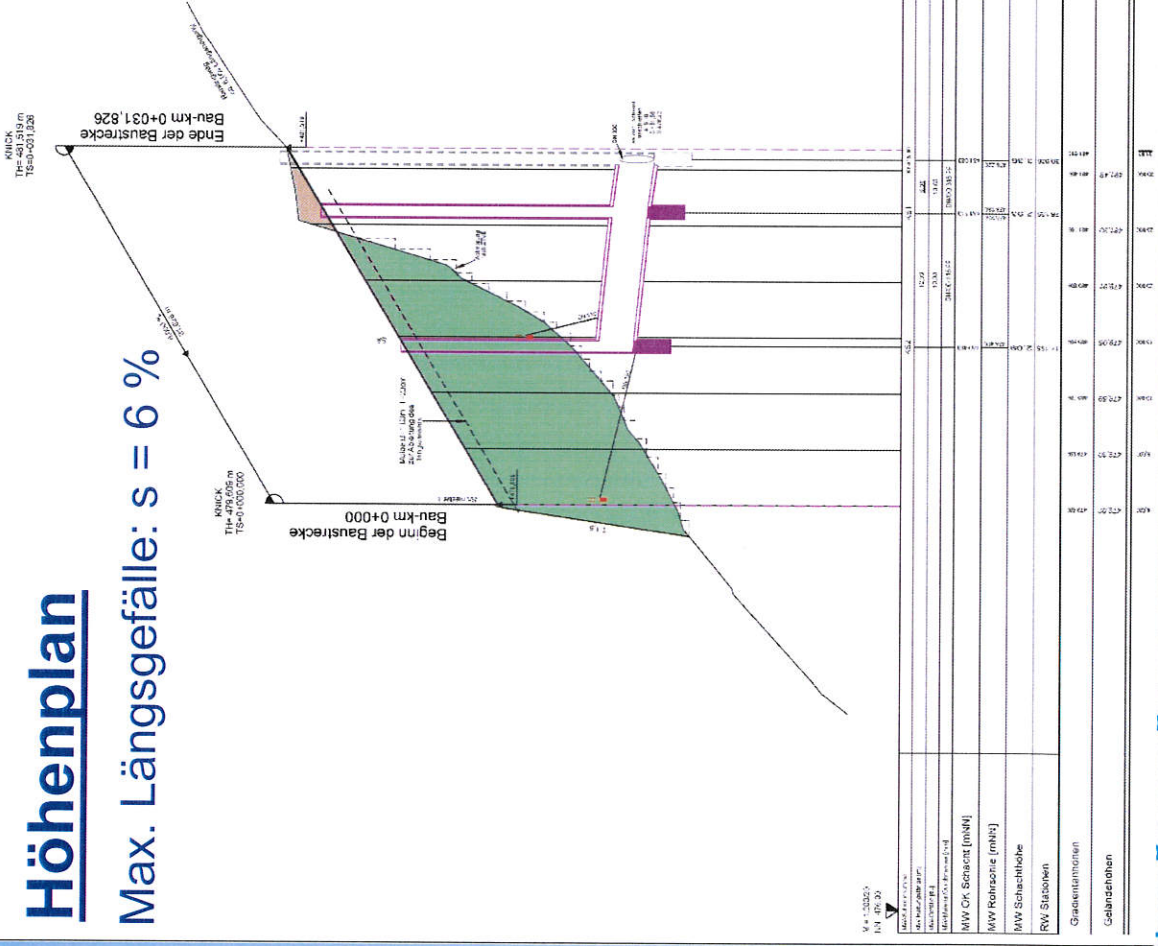

Öffentliche Ausschreibung:

Die Arbeiten waren öffentlich ausgeschrieben. 4 Unternehmen haben Ausschreibungsunterlagen angefordert.

Für die ausgeschriebenene Arbeiten ging **kein** Angebote ein.

Beschränkte Ausschreibung:

7 Firmen wurden angefragt. 3 Firmen wurden die Ausschreibungsunterlagen zugeschickt.

Für die ausgeschriebenen Arbeiten gingen 2 Angebote termingerecht ein.
Die Nachrechnung hat folgendes Ergebnis gezeigt (beginnend mit dem günstigsten Bieter):

1. Fa. Käser, Wolfegg	brutto	332.003,79 €
2. Bieter	brutto	355.352,40 €

Erschließung Allmendweg - Erweiterung

Kostenbericht

Gewerk:	Kostenberechnung		bepreistes LV	
	brutto inkl. BNK	brutto inkl. BNK	brutto inkl. BNK	Kostenanschlag brutto inkl. BNK
Strassenbau	93.000,00	110.000,00		166.000,00
Kanal	53.000,00	78.000,00		90.000,00
Wasserhauptleitung	35.000,00	46.000,00		55.000,00
Wasserhausanschlüsse	20.000,00	18.000,00		19.000,00
Straßenbeleuchtung	7.000,00	7.000,00		7.000,00
Grundstücksvermessung	10.000,00	10.000,00		10.000,00
LWL Leerrohre	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	223.000,00	274.000,00		352.000,00
Leitungsbau	31.000,00	31.000,00		36.000,00
Gesamt:	254.000,00	305.000,00		388.000,00



Erschließung Allmendweg - Erweiterung

Der Kostenanschlag beinhaltet Leistungen für die Erd-, Kanal-, Wasserleitungs-, Kabel- und Straßenbauarbeiten, Straßenbeleuchtung, Grundstücksvermessung und der Baunebenkosten in Höhe von

Brutto 388.000,- € (KA)

Das bepreiste LV aus dem Jahr 2018 weist einen Betrag in Höhe von

Brutto 305.000,- €

aus, so dass die Vergabesumme

ca. 27 %

über dem bepreisten LV liegt.

Zeitplan - ALT

Submission

Mitte Jan. 19

Vergabe der Bauleistung

Mitte Feb. 19

Baubeginn (je nach Wetter)

Anfang März 19

Baufertigstellung

(vor Pfingsten 19)

Anfang Juni 19

Zeitplan - **NEU**

Vergabe der Bauleistung

19.03.19

Baubeginn

23.04.19

Baufertigstellung

12.07.19

- Arbeiten im öffentlichen Bereich sind prioritär auszuführen
- AN hat die Anlieger rechtzeitig über Beeinträchtigungen per Wurfsendung zu informieren

Stadt Meersburg
Bodenseekreis

Vergabebesitzung



Erschließung Allmendweg - Erweiterung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH
Beratende Ingenieure VBI
Sigmaringen - Überlingen - Dresden

Verkehrsanlagen Wasserwirtschaft

Umweltplanung



Ingenieurbüro Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH

